RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

PROJETO DE SOFTWARE | Planejamento ágil com Scrum

DataForge — Plataforma de Tratamento de Dados

Responsável: Ocante Antonio Ié

Quadro Trello: https://trello.com/b/e6DzzVbX/dataforge-planejamento-scrum

1. Introdução

Defini o DataForge como proposta de uma plataforma híbrida voltada à importação, limpeza, padronização, rastreabilidade, análise e exportação de conjuntos de dados. O projeto busca reduzir o trabalho manual necessário para preparar dados de pesquisas e aplicações profissionais, preservando o histórico das transformações.

2. Métodos

Na primeira etapa, assumi a perspectiva de cliente e descrevi as funcionalidades esperadas para a aplicação. Na segunda, atuei como Product Owner, organizei um Product Backlog com 16 funcionalidades, defini prioridades por valor de negócio e configurei um quadro no Trello, com as colunas Product Backlog, Sprint Backlog, A fazer, Em andamento, Impedido, Em revisão, Em teste e Concluído.

Estruturei um cenário acadêmico com etapas distribuídas, identificação de responsável, prioridades, prazos e critérios de aceitação. Os cartões representam o planejamento do trabalho: os estados de progresso simulados não significam que as funcionalidades já estejam implementadas.

3. Resultados

3.1 Visão de produto e Product Backlog

Organizei as funcionalidades em quatro grupos: importação e validação; limpeza e rastreabilidade; exportação e análise; integrações, visualização e segurança. Priorizei inicialmente importação, validação, detecção de inconsistências, normalização e dicionário de controle, por seu impacto no núcleo funcional do DataForge.

Conjunto	IDs	Prioridade do planejamento
Dados e validação	DF-001 a DF-003	Crítica
Limpeza e rastreabilidade	DF-004 a DF-006	Crítica
Prévia, exportação e auditoria	DF-007 a DF-009	Alta
Geolocalização e	DF-010 a DF-012	Alta

integrações		
Redes, dashboard, interface e segurança	DF-013 a DF-016	Crítica/Alta

A listagem integral dos 16 itens está no arquivo backlog/product-backlog.csv do repositório.

3.2 Cronograma proposto

Sprint	Período	Objetivo
1	02–13/11/2026	Importação e validação
2	16–27/11/2026	Limpeza e rastreabilidade
3	30/11–11/12/2026	Prévia, exportação e auditoria
4	14–25/12/2026	Integrações, redes e segurança

Esses períodos correspondem ao cronograma hipotético do exercício; não registram entregas já realizadas.

4. Evidências do quadro Trello

Configurei o quadro “DataForge | Planejamento Scrum” com as oito etapas de acompanhamento. A imagem abaixo registra sua organização, incluindo Product Backlog, etiquetas e prazos. Na data da captura, ainda havia um cartão auxiliar denominado “Tarefas da sprint”, cuja presença não altera a distribuição dos cartões DF-001 a DF-016.

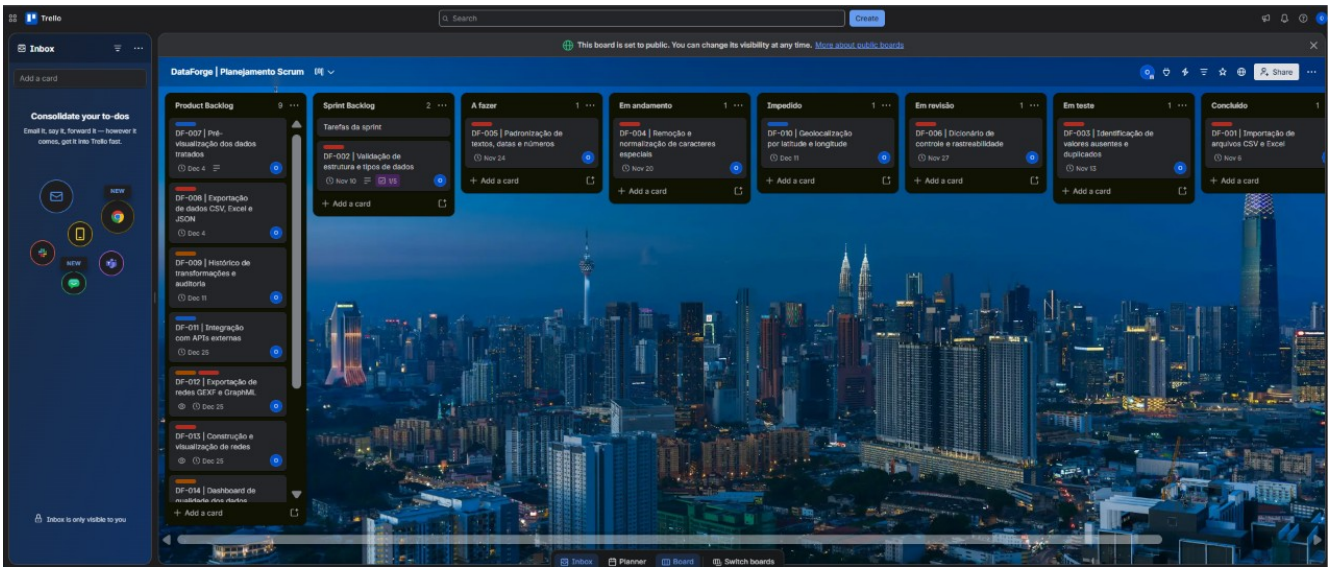


Figura 1 — Visão geral do quadro Scrum no Trello, capturada durante a configuração do planejamento.

No cartão DF-002, defini a prioridade P0 — Crítica, o responsável, a Sprint 1, o prazo e cinco critérios de aceitação. O checklist apresentado na imagem reflete somente o estado demonstrativo do planejamento.

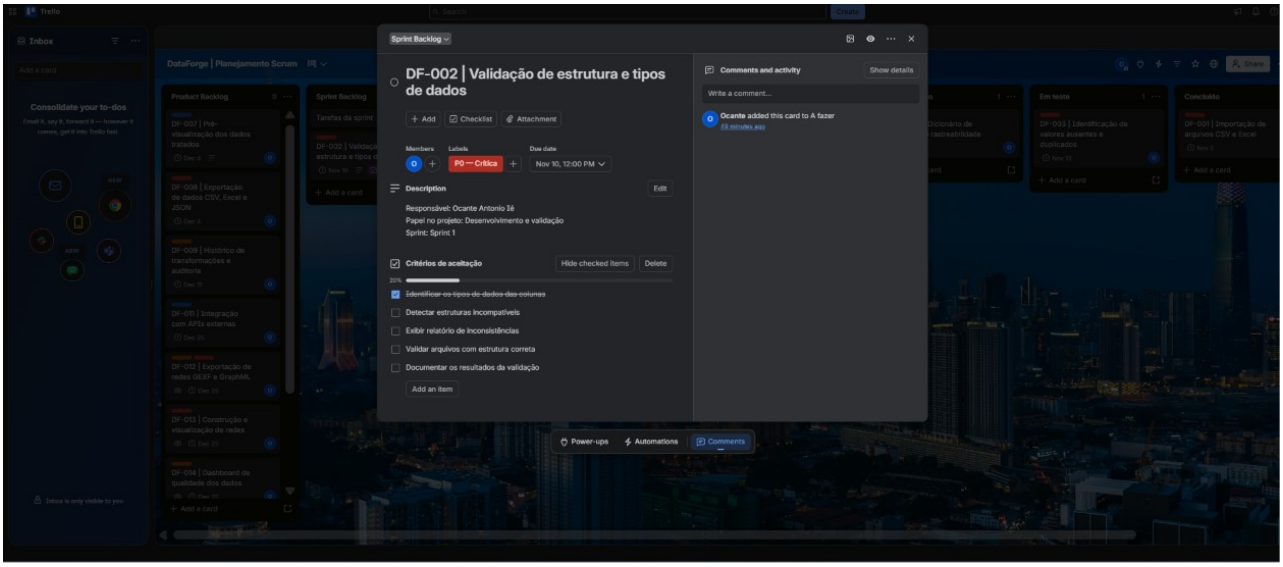


Figura 2 — Cartão DF-002 com membro, prioridade, prazo, descrição e checklist de critérios de aceitação.

5. Discussão e conclusão

A atividade permitiu aplicar os princípios de organização visual do trabalho ágil, separar o Product Backlog das tarefas planejadas e estabelecer prioridades, responsáveis e prazos. O uso do Trello permitiu demonstrar diferentes estágios de um fluxo Scrum/Kanban com rastreabilidade dos requisitos. Concluí a estruturação do planejamento acadêmico; o desenvolvimento e a validação efetiva do produto DataForge permanecem etapas futuras.

Referências

Roteiro de Aula Prática — Projeto de Software, páginas 2–3, material da disciplina.

Trello — https://trello.com/b/e6DzzVbX/dataforge-planejamento-scrum
